



KOKUDO

MOVE EARTH, MOVE EVERYTHING
日本国土開発株式会社

国道4号工事状況のお知らせ

～地下歩道工事状況～

安全第一で工事を進めてまいりますので、ご協力のほど宜しくお願いいたします。

●国道4号の増田地内において、道路改良工事(地下歩道工事)を夜間車道部の車線減少規制通行にて行っています。
工事期間が、令和4年3月31日までに変更となりました。
ご迷惑をお掛けしますが、引き続きご協力をお願いします。

9月の作業状況について

工法①



地面の削孔と鋼矢板の圧入を同時に行います。

1台の機械で削孔と圧入を同時に行います。

仮設工事の鋼矢板圧入作業を行っています。

工法②



地面の削孔を行います。



鋼矢板の圧入を単独で行います。

2台の機械で削孔と圧入を各々で行います。



鋼矢板の圧入完了状況

既設構造物の撤去を行いました。




規制場所	宮城県名取市増田地内
規制内容	夜間 車線減少(上り2車線⇒1車線、下り2車線⇒1車線)
規制時間	21時00分 から 翌6時00分 まで (昼は車道規制行いません)

10月の作業予定

西側(ゆず庵さん側)の仮設鋼矢板圧入作業を引き続き行います。大型機械を使用しての作業となります。

ご理解とご協力をお願いいたします。

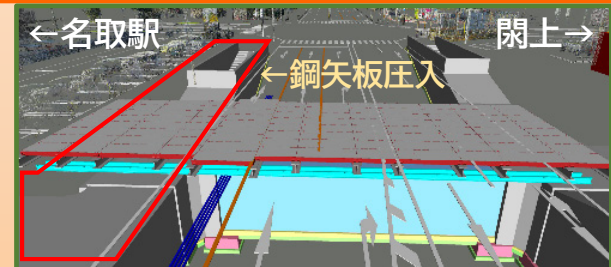

【発注者】:国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 交通対策課 TEL022-248-0061
 【工事監督】:国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 岩沼国道維持出張所 TEL0223-22-3039
 【施工者】:日本国土開発株式会社 東北支店 増田改良作業所 TEL022-302-7452 作業所長 菅野友壽



シンボルキャラクターのコクドくんです。コクドくんは、工事現場での隠れた危険の芽をついばみ、また地域の皆様とのコミュニケーションをはかります。

国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	9月25日 土	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	9月26日 日	無	—	休工
来週	9月27日 月	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	9月28日 火	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	9月29日 水	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	9月30日 木	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月1日 金	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月2日 土	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月3日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

■: 夜間作業 ■: 昼間作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

西側(ゆず庵さん側)の工事が本格的に始まります。
当面大型機械での工事となりますので、作業環境に配慮しながら工事を進めてまいります。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2021年9月24日



【施工者】
日本国土開発株式会社 東北支店
増田改良作業所
TEL 022-302-7452
作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

工事期間が、令和4年3月31日まで延長となりました。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	10月2日 土	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月3日 日	無	—	休工
来週	10月4日 月	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月5日 火	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月6日 水	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月7日 木	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月8日 金	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月9日 土	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業 <small>雨天状況次第で 休工となります。</small>
	10月10日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

: 夜間作業 : 昼間作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

西側(ゆず庵さん側)の工事が本格的に始まります。
当面大型機械での工事となりますので、作業環境に配慮しながら
工事を進めてまいります。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、
下記までご連絡ください。

2021年9月30日



【施工者】
日本国土開発株式会社 東北支店
増田改良作業所
TEL 022-302-7452
作業所長 菅野 友壽



国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ


日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。


国道4号地下歩道工事の増田地区改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

工事期間が、令和4年3月31日まで延長となりました。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	10月9日 土	無	—	休工
	10月10日 日	無	—	休工
来週	10月11日 月	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月12日 火	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月13日 水	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月14日 木	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月15日 金	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月16日 土	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月17日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

: 夜間作業

: 昼間作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

西側(ゆず庵さん側)の工事が本格的に始まります。

当面大型機械での工事となりますので、作業環境に配慮しながら工事を進めてまいります。

現在の仮設工事(鋼矢板圧入作業)は10月中に完了する予定です。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2021年10月8日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店

増田改良作業所

TEL 022-302-7452

作業所長 菅野 友壽

国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

工事期間が、令和4年3月31日まで延長となりました。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	10月16日 土	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月17日 日	無	—	休工
来週	10月18日 月	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月19日 火	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月20日 水	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月21日 木	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月22日 金	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月23日 土	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月24日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

 夜間作業

 昼間作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

西側(ゆず庵さん側)の工事が本格的に始まります。
当面大型機械での工事となりますので、作業環境に配慮しながら
工事を進めてまいります。

現在の仮設工事(鋼矢板圧入作業)は10月中に完了する予定です。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、
下記までご連絡ください。

2021年10月15日

【施工者】
日本国土開発株式会社 東北支店
増田改良作業所
TEL 022-302-7452
作業所長 菅野 友壽

国道4号地下歩道工事 作業内容のお知らせ

住民の皆様へ

日頃よりご協力頂き誠にありがとうございます。

国道4号地下歩道工事の増田地区改良工事において、下記の通り週間の作業予定をお知らせいたします。

工事期間が、令和4年3月31日まで延長となりました。

	日時	車道規制	時間帯	作業内容
今週	10月23日 土	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月24日 日	無	—	休工
来週	10月25日 月	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月26日 火	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月27日 水	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月28日 木	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月29日 金	有	21:00~6:00	西側 鋼矢板圧入作業
	10月30日 土	有	21:00~6:00	西側 大型機械搬出作業
	10月31日 日	無	—	休工

※作業内容により一部昼夜での施工となる予定です。

 夜間作業

 昼間作業

※天候及び作業の進捗状況により、作業時間帯及び作業内容が変更する場合があります。

西側(ゆず庵さん側)の工事が本格的に始まります。

当面大型機械での工事となりますので、作業環境に配慮しながら工事を進めてまいります。

現在の仮設工事(鋼矢板圧入作業)は10月中に完了する予定です。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

また、工事でお気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

2021年10月22日

【施工者】

日本国土開発株式会社 東北支店
増田改良作業所
TEL 022-302-7452
作業所長 菅野 友壽
